


برنامه زمانبندی ساخت پروژه سالن ورزشی مجتمع فولاد مبارکه

ID	Task Name	Duration	وزن	تاریخ شروع شمسی	تاریخ پایان شمسی	Predecessors	August 2023 Sep 23, '23	10/14	Nov 11, '23 11/18	12/23	Dec 30, '23
0	عملیات ساخت اسکلت فلزی سالن ورزشی فولاد مبارکه	53 days	83176	1402/9/1	1402/11/1						
1	ابلاغ قرارداد و شروع پروژه	0 days	0	1402/9/1	1402/9/1						
2	تامین متریال توسط کارفرما	0 days	0	1402/9/1	1402/9/1						
3	تامین آهن آلات	0 days	0	1402/9/1	1402/9/1						
4	پیش پرداخت توسط کارفرما جهت تامین رنگ	0 days	0	1402/9/1	1402/9/1						
5	مرحله اول	33 days	79229	1402/9/1	1402/10/9						
6	ساخت ستون	27 days	79229	1402/9/1	1402/10/2						
7	ساخت استوری 1 و 2	18 days	18043	1402/9/1	1402/9/21	3,1					
8	ساخت بادبند بدنه	19 days	33855	1402/9/7	1402/9/28	7FS-13 days					
9	ساخت بادبند سقف	16 days	7428	1402/9/11	1402/9/28	8FS-16 days					
10	ساخت ساگراد، زد، گاتر	15 days	7870	1402/9/13	1402/9/29	8FS-14 days					
11	سند بلاست و رنگ	14 days	12033	1402/9/16	1402/10/2	7FS-5 days					
12	سند بلاست و رنگ ستون	18 days	0	1402/9/18	1402/10/7						
13	سند بلاست و رنگ استوری 1 و 2	7 days	0	1402/9/18	1402/9/25	7FS-4 days,4					
14	سند بلاست و رنگ بادبند بدنه	14 days	0	1402/9/22	1402/10/7	8FS-6 days					
15	سند بلاست و رنگ بادبند سقف	7 days	0	1402/9/25	1402/10/2	9FS-4 days					
16	سند بلاست و رنگ ساگراد، زد، گاتر	7 days	0	1402/9/28	1402/10/5	10FS-2 days					
17	ارسال به سایت	7 days	0	1402/9/30	1402/10/7	11FS-2 days					
18	ارسال ستون	14 days	0	1402/9/23	1402/10/9						
19	ارسال استوری 1 و 2	5 days	0	1402/9/23	1402/9/28	13FS-2 days					
20	ارسال بادبند بدنه	10 days	0	1402/9/27	1402/10/7	14FS-10 days					
21	ارسال بادبند سقف	6 days	0	1402/9/28	1402/10/4	15FS-4 days					
22	ارسال ساگراد، زد، گاتر	6 days	0	1402/10/2	1402/10/7	16FS-4 days					
23	مرحله دوم	6 days	0	1402/10/3	1402/10/9	17FS-5 days					
24	ساخت ستون	19 days	63687	1402/9/30	1402/10/20						
25	ساخت استوری 1 و 2	16 days	63687	1402/9/30	1402/10/17						
26	ساخت بادبند بدنه	12 days	25443	1402/9/30	1402/10/13	10					
27	ساخت بادبند سقف	13 days	38244	1402/10/4	1402/10/17	26FS-9 days					
28	سند بلاست و رنگ	11 days	0	1402/10/7	1402/10/18						
29	سند بلاست و رنگ ستون	6 days	0	1402/10/7	1402/10/13	26FS-6 days					
30	سند بلاست و رنگ استوری 1 و 2	6 days	0	1402/10/13	1402/10/18	27FS-5 days					
31	ارسال به سایت	9 days	0	1402/10/12	1402/10/20						
32	ارسال ستون	5 days	0	1402/10/12	1402/10/16	29FS-2 days					
33	ارسال استوری 1 و 2	6 days	0	1402/10/15	1402/10/20	30FS-4 days					
34	مرحله سوم	19 days	40260	1402/10/11	1402/11/1						
35	ساخت ستون	17 days	40260	1402/10/11	1402/10/28						
36	ساخت استوری 2، تیر، استیر و استرات	6 days	2200	1402/10/11	1402/10/16	26FS-3 days					
37	ساخت بادبند بدنه	13 days	17820	1402/10/14	1402/10/27	36FS-3 days					
38	ساخت بادبند سقف	8 days	10978	1402/10/19	1402/10/27	37FS-8 days					
39	سند بلاست و رنگ	8 days	9262	1402/10/20	1402/10/28	37FS-7 days					
40	سند بلاست و رنگ ستون	12 days	0	1402/10/17	1402/10/30						
41	سند بلاست و رنگ استوری 1 و 2	4 days	0	1402/10/17	1402/10/20	36					
42	سند بلاست و رنگ ساگراد، زد، گاتر	7 days	0	1402/10/21	1402/10/28	37FS-6 days					
43	سند بلاست و رنگ بادبند بدنه	4 days	0	1402/10/25	1402/10/28	38FS-3 days					
44	سند بلاست و رنگ بادبند سقف	4 days	0	1402/10/26	1402/10/30	39FS-3 days					

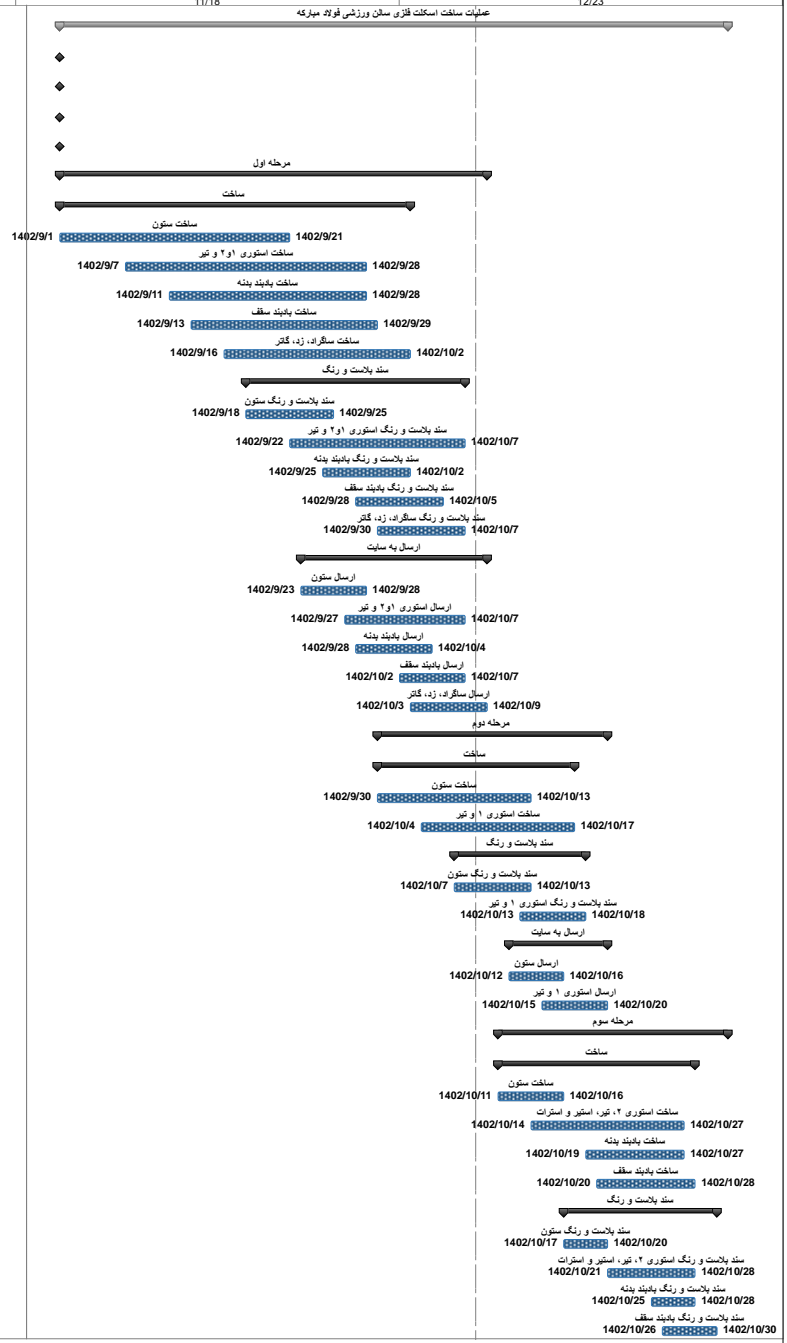

برنامه زمانبندی ساخت پروژه سالن ورزشی مجتمع فولاد مبارکه

ID	Task Name	Duration	وزن	تاریخ شروع شمسی	تاریخ پایان شمسی	Predecessors	August 2023 Sep 23, '23	10/14	Nov 11, '23 11/18	12/23	Dec 30, '23
45	ارسال به سایت	11 days	0	1402/10/19	1402/11/1						
46	ارسال ستون	4 days	0	1402/10/19	1402/10/23	41FS-2 days					
47	ارسال استوری 2، تیر، استیر و استرات	7 days	0	1402/10/23	1402/10/30	42FS-6 days					
48	ارسال بادبند بدنه	4 days	0	1402/10/26	1402/10/30	43FS-3 days					
49	ارسال بادبند سقف	4 days	0	1402/10/27	1402/11/1	44FS-3 days					
50	پایان	0 days	0	1402/11/1	1402/11/1	19,20,21,22,32,33,46,47,48,49					

