


ID	Task Mode	Task Name	Duration	تاریخ شروع	تاریخ پایان	وزن	پیشرفت واقعی
0		پروژه تدوین نقشه راه توسعه قابلیت کسب و کار شرکت نگین	۱۲۳ days	۱۰۲/۱۲/۲۸	۱۰۳/۶/۱۴	۱۰۰	۱۰٪
1		مرحله ۱- تبیین ساختار راهبری و مدیریت پروژه	46 days	102/12/28	103/2/31	10	100%
2		شناسایی ذینفعان پروژه	4 days	102/12/28	103/1/2	3	100%
3		تدوین سند مدیریت ارتباطات پروژه	4 days	103/2/12	103/2/17	2	100%
4		تعریف خروجی ها و نتایج پروژه	4 days	102/12/28	103/1/2	1	100%
5		تدوین برنامه زمانبندی پروژه	4 days	103/1/16	103/1/22	1	100%
6		تعریف نقش ها و مسئولیت ها در پروژه	3 days	103/2/18	103/2/27	2	100%
7		بررسی و تصویب سند مدیریت پروژه	4 days	103/2/20	103/2/31	1	100%
8		تحويل سند مدیریت پروژه	0 days	103/2/31	103/2/31	0	100%
9		مرحله ۲- بازنگری و تکمیل نقشه قابلیت های کسب و کار	18 days	103/2/31	103/3/24	15	0%
10		جمع آوری اطلاعات و مدارک نقشه موجود قابلیت ها و فرایندها	3 days	103/3/1	103/3/3	2	0%
11		تهیه طرح اولیه نقشه قابلیت های کسب و کار و ارتباط با فرایندها	5 days	103/3/4	103/3/10	8	0%
12		تهیه طرح اولیه نقشه قابلیت ها	2 days	103/3/4	103/3/7	4	0%
13		تهیه ارتباطات فرآیندها با نقشه قابلیت های کسب و کار	1 day	103/3/8	103/3/8	1	0%
14		برگزاری جلسه پرزنت طرح اولیه نقشه قابلیت ها و ارتباط با فرآیندها	1 day	103/3/9	103/3/9	2	0%
15		بررسی و تحلیل نقشه قابلیت ها و ارتباط با فرایندها	1 day	103/3/10	103/3/10	1	0%
16		تصمیم گیری و تأمین ابزار	8 days	103/3/11	103/3/22	4	0%
17		شناسایی و ارزیابی ابزارهای قابل استفاده داخلی و بین المللی	3 days	103/3/11	103/3/15	2	0%
18		بررسی و تدوین طرح تأمین ابزار و مخزن مدیریت قابلیت ها	3 days	103/3/16	103/3/18	1	0%
19		بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزار و مخزن مدیریت قابلیت ها	2 days	103/3/21	103/3/22	1	0%
20		بررسی و تصویب سند نهایی نقشه قابلیت های کسب و کار	2 days	103/3/23	103/3/24	1	0%
21		تحويل سند نقشه قابلیت ها	0 days	103/2/31	103/2/31	0	0%

ID	Task Name	Duration	تاریخ شروع	تاریخ پایان	وزن	پیشرفت واقعی
22	مرحله ۳- بازنگری و تدوین متدولوژی مدیریت بلوغ قابلیت های کسب و کار	15 days	103/3/1	103/3/21	40	0%
23	جمع آوری اطلاعات و مدارک متدولوژی جاری مدیریت قابلیت ها	2 days	103/3/1	103/3/2	4	0%
24	شناسایی روش ها و تجربیات مدیریت بلوغ قابلیت ها در سطح بین المللی	5 days	103/3/3	103/3/9	5	0%
25	تدوین طرح اولیه متدولوژی مدیریت بلوغ قابلیت های کسب و کار	6 days	103/3/10	103/3/17	26	0%
26	تدوین مدل بلوغ سنجی قابلیت ها	2 days	103/3/10	103/3/11	11	0%
27	تدوین مدل تحلیل اهمیت استراتژیک	2 days	103/3/14	103/3/15	10	0%
28	بررسی و تحلیل متدولوژی پیشنهادی و تعیین اصلاحات مورد نیاز	2 days	103/3/16	103/3/17	5	0%
29	بررسی و تصویب سند نهایی دستورالعمل مدیریت قابلیت های کسب و کار	2 days	103/3/18	103/3/21	5	0%
30	تحويل دستورالعمل مدیریت قابلیت های کسب و کار	0 days	103/3/21	103/3/21	0	0%
31	مرحله ۴- ارزیابی سطح بلوغ قابلیت های کسب و کار	22 days	103/3/25	103/4/25	15	0%
32	تعیین تیم ارزیابی سطح بلوغ و آموزش متدولوژی	3 days	103/3/25	103/3/29	2/5	0%
33	برنامه ریزی و برگزاری جلسات ارزیابی سطح بلوغ قابلیت ها	11 days	103/3/30	103/4/13	10/5	0%
34	برگزاری جلسات ارزیابی با تمرکز بر گروه قابلیت ؟؟؟	3 days	103/3/30	103/4/1	3/5	0%
35	برگزاری جلسات ارزیابی با تمرکز بر گروه قابلیت ؟؟؟	4 days	103/4/4	103/4/7	3/5	0%
36	برگزاری جلسات ارزیابی با تمرکز بر گروه قابلیت ؟؟؟	4 days	103/4/8	103/4/13	3/5	0%
37	جمع بندی و تدوین گزارش سطح بلوغ قابلیت ها و نقشه حرارتی	5 days	103/4/14	103/4/20	1	0%
38	بررسی و تصویب گزارش سطح بلوغ و نقشه حرارتی قابلیت ها	3 days	103/4/21	103/4/25	1	0%
39	تحويل گزارش سطح بلوغ قابلیت های کسب و کار	0 days	103/4/25	103/4/25	0	0%
40	مرحله ۵- تدوین طرح توسعه و بهبود قابلیت های کسب و کار	22 days	103/4/26	103/5/24	15	0%
41	تدوین سناریوها، نقشه راه و برنامه توسعه و بهبود قابلیت های کسب و کار	5 days	103/4/26	103/5/1	8	0%
42	تحلیل و تأیید اولیه برنامه توسعه و بهبود قابلیت ها	5 days	103/5/2	103/5/8	2	0%
43	برگزاری جلسات با ذینفعان برنامه توسعه قابلیت ها	5 days	103/5/9	103/5/15	3	0%
44	ارائه و تصویب برنامه توسعه و بهبود قابلیت ها	7 days	103/5/16	103/5/24	2	0%

ID		Task Name	Duration	تاریخ شروع	تاریخ پایان	وزن	پیشرفت واقعی
45		تحویل برنامه توسعه و بهبود قابلیت ها	0 days	103/5/24	103/5/24	0	0%
46		مرحله ۶- ثبت برنامه توسعه و بهبود قابلیت ها	61 days	103/3/23	103/6/14	5	0%
47		تأمین مخزن و ابزار مدیریت قابلیت ها	15 days	103/3/23	103/4/12	1	0%
48		راه اندازی مخزن و ابزار مدیریت قابلیت ها	15 days	103/4/13	103/5/2	1	0%
49		آموزش ابزار مدیریت قابلیت ها به راهبران و کاربران	15 days	103/4/13	103/5/2	1	0%
50		ورود و ثبت مدل ها و برنامه توسعه قابلیت ها به ابزار	15 days	103/5/25	103/6/14	2	0%
51		تحویل مخزن تکمیل شده	0 days	103/6/14	103/6/14	0	0%

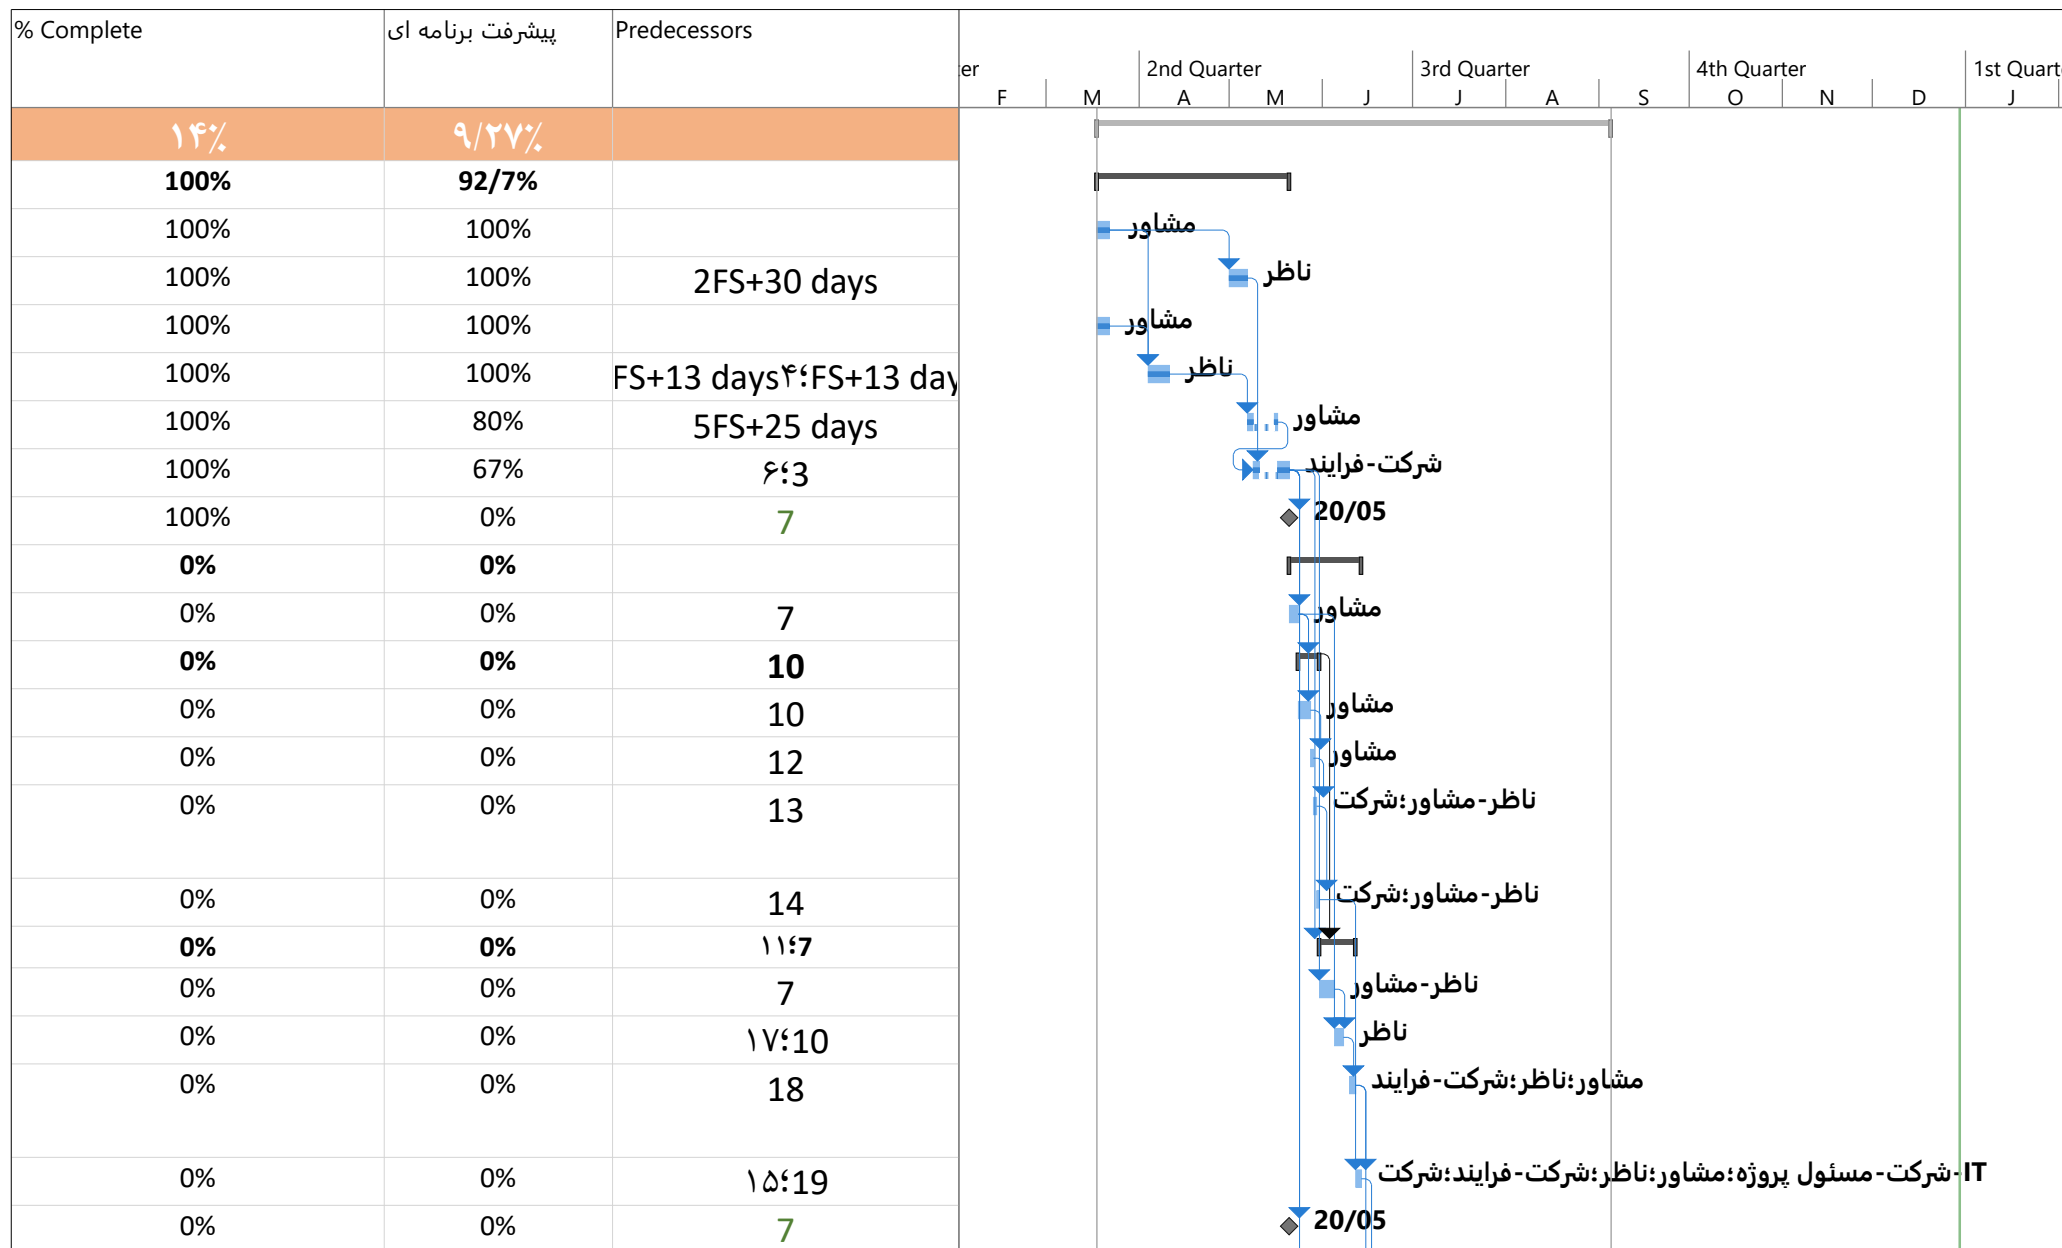

% Complete	پیشرفت برنامه ای	Predecessors	er	F	M	2nd Quarter		J	3rd Quarter		A	S	4th Quarter			1st Quarter	J
0%	0%	44															
0%	0%																
0%	0%	19															
0%	0%	47															
0%	0%	47															
0%	0%	۴۴:49															
0%	0%	50															
